


b. par un hachurage différent : chaque zone homogène contenant de l'amiante


| | | |
|-----------------|-----------|---------------------|
| | Friable : | Non friable (Dur) : |
| Prélèvement : | ● | ■ |
| Zone homogène : | ▨ | ▩ |

| | |
|--|-----------------------------|
| N° et provenance des échantillons contenant de l'amiante : | Selon PV labo ou PJ n° |
|--|-----------------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| N° et provenance des échantillons ne contenant pas d'amiante : | Selon PV labo ou PJ n° |
| PF n° 1 Zone 5 - Salle de classe (RDC) | AMI06-4223 |


ZONE 1 ECOLE MATERNELLE

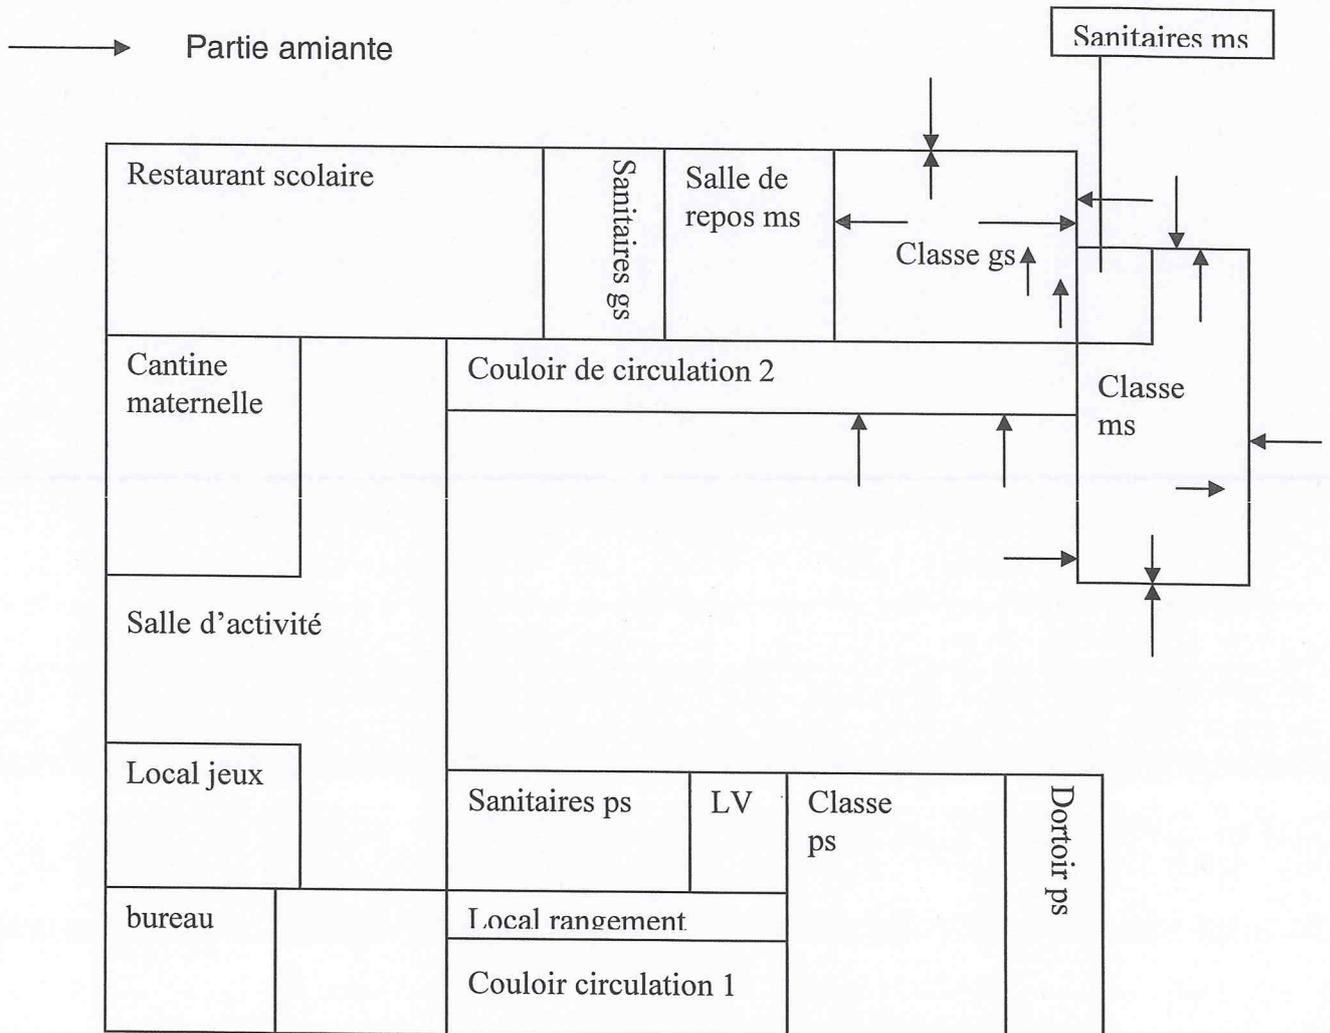




B 2. TABLEAU DESCRIPTIF ET CROQUIS


| Niveau et local | Partie d'ouvrage | 1. Description du matériau : 2. Résultat de la recherche d'amiante : 3. Devoir de conseil : |
|------------------------------------|---------------------------|---|
| Zone 1 - ECOLE MATERNELLE EXT(RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Sol naturel 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Maçonnerie ciment et plaques planes amiante ciment 2. Murs et poteaux intérieurs - Revêtements durs des murs Fiche technique : - Resultat : Contient de l'amiante sur décision opérateur Etat de conservation : Bon état : Cf paragraphe B5.1 CGS |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Dalle ciment et revêtement bitumineux 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Sanitaires gs (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Revêtement plastique 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre et tissu de verre peint, faïence, plaques planes décoratives en amiante ciment. 2. Murs et poteaux intérieurs - Revêtements durs des murs Fiche technique : - Resultat : Contient de l'amiante sur décision opérateur Etat de conservation : Bon état : Cf paragraphe B5.1 CGS |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Classe ms (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Revêtement plastique 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint, plaques planes décoratives en amiante ciment 2. Murs et poteaux intérieurs - Revêtements durs des murs Fiche technique : - Resultat : Contient de l'amiante sur décision opérateur Etat de conservation : Bon état : Cf paragraphe B5.1 CGS |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Dortoir ps (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Revêtement plastique 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |



| Niveau et local | Partie d'ouvrage | 1. Description du matériau : 2. Résultat de la recherche d'amiante : 3. Devoir de conseil : |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Zone 1 - Classe ps (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Revêtement plastique 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint et bois 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Couloir circulation 1 (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Carrelage 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint et bois 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Sanitaires ps (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Carrelage 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint et faïence 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Local lave linge (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Carrelage 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint et faïence 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Local rangement (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Carrelage 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Sous face dalle minérale peinte 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |



| Niveau et local | Partie d'ouvrage | 1. Description du matériau : 2. Résultat de la recherche d'amiante : 3. Devoir de conseil : |
|---|---------------------------|---|
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Salle de repos ms (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Revêtement plastique 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 - Classe grande section (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Revêtement plastique 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint et plaques planes amiante ciment. 2. Murs et poteaux intérieurs - Revêtements durs des murs Fiche technique : - Resultat : Contient de l'amiante sur décision opérateur Etat de conservation : Bon état : Cf paragraphe B5.1 CGS |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 1 bis PREAU COUVERT(RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Bitume 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Cloisons bois 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Tôles métalliques 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 2 - BAC A SABLE EXTERIEUR (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Bitume 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Cloisons bois 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Ardoises souples bitumineuses 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 2 - Bac à | Sol + plancher bas : | 1. Sable |



| Niveau et local | Partie d'ouvrage | 1. Description du matériau : 2. Résultat de la recherche d'amiante : 3. Devoir de conseil : |
|---|---------------------------|--|
| sable int (RDC) | | 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Cloisons bois 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Lambris bois 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 3 - RESTAURANT SCOLAIRE EXT (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Sol naturel 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Maçonnerie ciment peint 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Dalle ciment et revêtement bitumineux 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 3 - Réserve (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Carrelage 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Sous face dalle minérale peinte 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 3 - Dégagement (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Carrelage 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Sous face dalle minérale peinte 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
| Zone 3 - Urinoir (RDC) | Sol + plancher bas : | 1. Carrelage 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Mur + cloison : | 1. Plâtre peint et faïence 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Plafond + plancher haut : | 1. Faux plafond décoratif en dalle 2. Prélèvement : Sans objet |
| | Autre : | 1. Néant 2. Prélèvement : Sans objet |
